

BCT1

Work Order Type: MPM

## TOYOTA - Planned Work Order Details

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:26 AM

WOT-101

Work Order	BCT1629975	Responsibility						
Description	PM T6 LEVEL5.5 SWITCH RAIL TO FINESSE EX246 - T2 1M	Reported By	Supervisor	Lead	Owner	Crew Work Group	Maint. Shift	Vendor
		Maximo Admin	Abel Cano	Jose Luis Avila		BCTMT	4	

## Work Order Details

Location:	T2-CAB-PF-CV	PAINT 2 CAB PAINT FINISH CONVEYORS	Target Start	11/26/25 10:00 PM	Priority	3
Asset No:	297781	T2 CAB T6 LEVEL5.5 SWITCH RAIL TO FINESSE EX246	Target Finish	11/26/25 10:40 PM	Calc. Priority	8
Asset Short Desc:	T2-CAB-T6-EX246		Schedule Start		Asset Loc. Pri.	2
Rank:	B		Schedule Finish		WO Type	MPM
Route No:			EST(Hrs)	0.67	WO Status	WSCH
Job Plan No:	61375	REV: 4	Finish No Later Than	12/26/25 10:40 PM	Parent WO	
PM:	236878	FREQ: 1 MONTHS	Work Condition	WW	Column Loc	E-18

## Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
10	SEGURIDAD, JSRA Y LOCK OUT, DELIMITE AREA	UBICAR LAS FUENTES DE ENERGIA EN PLACARD Y JSRA, APLICAR LOTO, REVISAR Y FIRMAR POR LOS INVOLUCRADOS	SIN ENERGIA RESIDUAL, EQUIPO DESENERGIZADO, DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES		0	
Observations						

BCT1

Work Order Type: MPM

# TOYOTA - Planned Work Order Details

GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:26 AM

WOT-101

**Tasks**

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
20	REALIZAR INSPECCION Y LIMPIEZA DE MICRO SWITCH DE FINAL DE CARRERA DE LEVAS	LIMPIAR SENSORES CON TOALLA CON ALCOHOL, ASEGURAR QUE LA BASE Y ACTUADOR ESTE DEBIDAMENTE SUJETOS	ASEGURAR EL SISTEMA AUTOMATICO DE TRASPORTADORES		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Switch Rail Unit The equipment which makes a paint dolly divergency &amp; convergency. The general unit will be the following composition.</li> </ul> <p>(1) Fixed Frame (2) Movable Rail ( Switch Rail ) (3) Fixed Rail (4) Motor Boxes (5) Tension Rod (6) Control Box</p>
<b>Observations</b>						
30	REVISION Y LIMPIEZA DE MOTOR	QUE TENGA BUEN APRIETE Y NO TENGA TORNILLOS FLOJOS	VERIFIQUE MARCA DE TORQUE		0	
<b>Observations</b>						
40	REVISION DE CAJA DE CONEXIONES DE MOTOR	REVISAR AJUSTE DE CLEMAS, REVISAR FASES NO ATERRIZADAS	VERIFIQUE CINTA DE AISLAMIENTO NO PRESENTE DESGASTE O DAnO PARA EVITAR ARQUEO O CORTO, REPARAR DE SE		0	
<b>Observations</b>						
50	REVISION DE CONDICION DE AISLAMIENTO DE MOTOR	HACER PRUEBAS CON ALL TEST PRO Y MEDICION DE CORRIENTE COMPARANDOLA CON LA PLACA DEL MOTOR,	BASARSE EN WIS DE USO DE ALL TEST PRO, GARANTIZAR OPTIMO DESEMPEnO DE MOTOR		0	
<b>Observations</b>						
60	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE MOTOR	REVISION DE TABLERO DE POTENCIA, CONEXIONES, FOCO INDICADOR, INVERSOR Y DISPLAY	UTILICE LAMPARA TERMOGRAFICA PARA DETERMINAR POSIBLES FALSOS EN POTENCIA		0	
<b>Observations</b>						

BCT1

Work Order Type: MPM

# TOYOTA - Planned Work Order Details

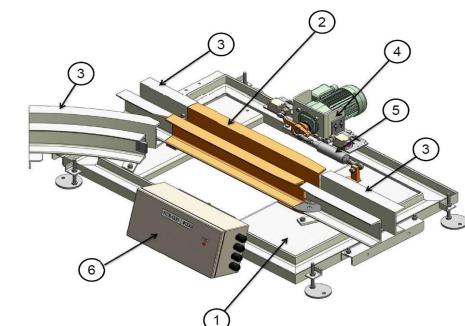
GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

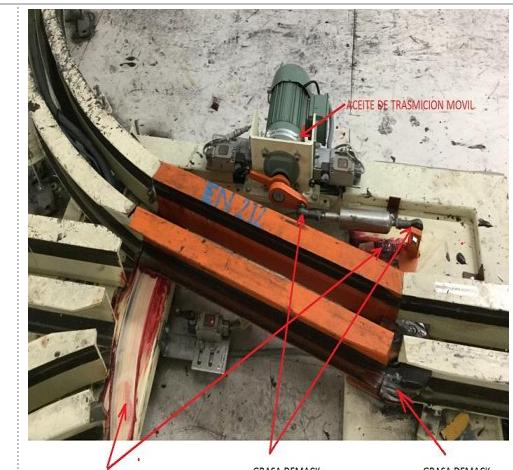
Nov 19, 2025 9:26 AM

WOT-101

**Tasks**

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
80	LUBRICACION DE BASES DESLIZANTE DE RIEL	REALIZAR LIMPIEZA Y COLOCAR CAPA DE GRASA MOBIL ROJA EN ZONAS DESLIZANTES	VERIFIQUE QUE NO TENGA DESGASTE CONFIRMANDO CON LA ALINEACION DE RIEL A RACK		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Switch Rail Unit The equipment which makes a paint dolly divergency &amp; convergency. The general unit will be the following composition.</li> </ul> <p>(1) Fixed Frame (2) Movable Rail ( Switch Rail ) (3) Fixed Rail (4) Motor Brakes (5) Tension Rod (6) Control Box</p> 

**Observations**

90	LUBRICACION DE BALERO EJE DE DESVIADOR	LUBRICAR CON GRASA DEMAG PARTE CENTRAL DE EJE, REEMPLACE EN CASO DE JUEGO EXCESIVO O DESGASTE	EVITAR QUE SE ATORE Y OPERACION OPTIMA, BALERO: YNA0361811		0	
----	--	---	--	--	---	--

**Observations**

100	REVISION DE TORNILLERIA	REVISAR TORQUE Y MARCA DE TORQUE	DE SER NECESARIO APRETAR SEGUN ESPECIFICACION Y PONER MARCA DE TORQUE		0	
-----	-------------------------	----------------------------------	---	--	---	--

**Observations**

BCT1

Work Order Type: MPM

# TOYOTA - Planned Work Order Details

GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:26 AM

WOT-101

**Tasks**

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
110	REVISION DE BRACKETS Y RODILLO DE TENSION Y TRASMISION	REVISAR OPRESORES DE BRACKETS A MOTOREDUCTOR Y TORNILLERIA, APlicar GRASA DEMAG EN BALEROS DE TENSOR	APRETAR, PONER MARCA DE TORQUE, BALERO ROD END: YN7000FT83 & YN7000LL1X, SPRING: YNA0361842		0	
<b>Observations</b>						
120	REALIZAR CONFIRMACION	HACER 5 CICLOS EN MANUAL Y EN VACIO	ASEGURAR EL SISTEMA DE TRASMISION DE TRANSPORTADORES		0	
<b>Observations</b>						
130	REALIZAR CONFIRMACION	VERIFIQUE QUE NO EXISTE RUIDO ANORMAL, Y QUE LA RUEDA GIRE LIBREMENTE	ASEGURAR EL SISTEMA DE TRASMISION DE TRANSPORTADORES		0	
<b>Observations</b>						
140	LIMPIEZA DE AREA	5'S HERRAMIENTA Y MATERIALES	VERIFIQUE HERRAMIENTA COMPLETA Y DISPONER DE MATERIALES EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE		0	
<b>Observations</b>						
150	ACTUALIZACION Y REVISION DE TABLERO DE CONSUMIBLES	REPORTE CANTIDAD DE REFACCIONES USADAS Y RETIRADAS DE TABLERO DE REFACCIONES PARA MANTENER ESTANDAR	ASEGURAR SISTEMA DE PARTES EN LINEA, REPORTAR EN MAXIMO CONSUMO Y REFACCIONES REQUERIDAS		0	
<b>Observations</b>						

BCT1

Work Order Type: MPM

**TOYOTA - Planned Work Order Details**  
**GL Account: 21AG+5130120006+M9150M**

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:26 AM

WOT-101

**Tasks**

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
160	EVALUACION Y AUDITORIA	GL/AML CONFIRMAR REALIZACION DEL PM, FIRMAR DE RECIBIDO Y COMPRADO	FIRMA GL / AML _____ ASEGURAR DOUBLE CHECK DEL EQUIPO ANTES DEL ARRANQUE		0	

**Observations****Technician Sign Off**Print  
Name: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Time: \_\_\_\_\_

Actual Hours (hh:mm): 0 \_\_\_\_\_

Asset No 297781 T2 CAB T6 LEVEL5.5 SWITCH RAIL TO FINESSE EX246

Work Order No BCT1629975 PM T6 LEVEL5.5 SWITCH RAIL TO FINESSE EX246 - T2 1M
